

**VERBALE DI ACCORDO FRA
RFI SPA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI ROMA - U.T. NORD OVEST
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-FAST-UGL DELLA REGIONE LAZIO
RSU 18- ROMA INFRASTRUTTURA**

La RSU 18 si dichiara validamente costituita e rappresentata.

Come previsto dal Verbale Accordi OO.SS./RSU/RFI del 30/01/2013, che si intende integralmente richiamato, la Società espone i programmi di lavoro riguardanti le lavorazioni del 3° trimestre 2013 in conto manutenzione straordinaria della UT Nord Ovest allegate al presente verbale. Dopo ampia discussione le parti, anche in considerazione dell'articolazione dell'attività n. 1 di cui all'allegato, concordano quanto segue:

particolare

- per quanto concerne l'attività n. 1 di cui alla proposta allegata, relativamente al turno 2, la seguente nuova articolazione:
 - a) 22.00 – 06.00
 - b) 05.00 – 13.00
- l'effettuazione della terza notte settimanale individuale non consecutiva, solo per l'attività specificatamente indicata nell'apposita colonna dell'allegato, per un massimo di n.1 al mese.
- la necessità di effettuare su base volontaria l'eventuale prestazione notturna Ven/Sab solo per le attività specificatamente indicate nell'apposita colonna dell'allegato; si precisa inoltre che gli impianti interessati dovranno settimanalmente verificare la disponibilità alle prestazioni volontarie garantendo la rotazione del personale stesso;
- le eventuali maggiori prestazioni connesse all'esecuzione delle attività saranno compensate attraverso gli istituti contrattualmente previsti;
- la necessità, secondo le diverse particolarità territoriali, dell'utilizzo di un unico mezzo aziendale - condotto da un agente non impegnato nelle lavorazioni - per raggiungere gli impianti individuati come punto d'impiego solo per l'attività n. 3;
- gli Agenti inseriti nel Turno di Reperibilità non saranno utilizzati per le attività suddette
- La Società comunica che sulla base delle attuali esigenze produttive non ritiene al momento prioritario il regolare presenziamento nelle giornate di Sabato e Domenica in regime di Reperibilità
- verrà rispettato il programma ferie già consolidato


Le prestazioni connesse all'esecuzione delle attività sopra indicate saranno compensate attraverso gli istituti contrattualmente previsti, garantendo allo scopo la rotazione di tutto il personale.

Roma, 13.06.201


Per RFI Sp.A.



Per le RSU



Per le OO.SS.





Elenco attività straordinarie U.T. Nord Ovest
III TRIMESTRE 2013



S E T T O R E	N A T T O R E	Attività	Tipo Attività E = Estern. I = Intern.	Linea	Località/Tratta	Periodo		N° Interventi programmati			Tipo	CDL interessati	N. Ag.	Altri CDL coinvolti	N. Ag.	Attività Notturna (SI o NO)	Notte a Settimana	Necessità Ven./Sub	3 ^a notte individuale (SI o NO)		
						da	a	diurne / orari	notturne / orari												
A	1	Rinnovo Deviatori Orte	E	LL	Orte	15/07/2013	10/08/2013	10	10,00 - 12,15												
R	2	Sostituzione Deviatori con campate di binario Attiliano	E	LL	Attiliano	23/08/2013	07/09/2013	10	9,43 - 11,43	9	0,30 - 5,30	P/D	LW09	Orte	4	TE07 IS07	2 3	SI	4	SI	NO
A	3	Rinnovo Binari DD	E	DD	PM S. Oreste - PC Capena Binario PARI	09/09/2013	30/09/2013	0		60	0,30 - 5,30	Linea	LW10 LV08	Gallese Monterotondo	2 2	TE06 TE07 IS06 IS07	1 1 1 1	SI	4	NO	SI***
S	4	Rinnovo TE LL	E	LL	Orte - Gallese Gallese-Civita C.	01/07/2013	30/09/2013	95	10,00 - 12,15	34	0,30 - 4,30	Linea	TE07	Orte	4	TE06 TE08	2 2	SI	2/3	SI	NO




* Vedi presentazione

** A partire dal 9 Settembre 2013 verranno utilizzate solo le interruzioni Durne

*** Quotora necessaria garantendo rotazione del Personale



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Roma, 13 Giugno 2013

ATTIVITA' N. 1

III TRIMESTRE 2013

U.T. NORD OVEST

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE


ORTE : DEVIATOI N. 44 E 45

I lavori consistono nel rinnovamento e risanamento della massicciata dei **Deviatori n. 44 e 45 Stazione di Orte**, posti sui binari di corsa e facenti comunicazione tra le linee DD e LL.



I lavori sono comprensivi delle operazioni di saldatura e/o incollaggio, con successiva regolazione della Lunga Rotataia Saldata e comportano inoltre la modifica del tracciato Binario Pari e Dispari LL con *sdoppiamento* Comunicazione n. 46.

ORTE : DEVIATOI N. 44 E 45

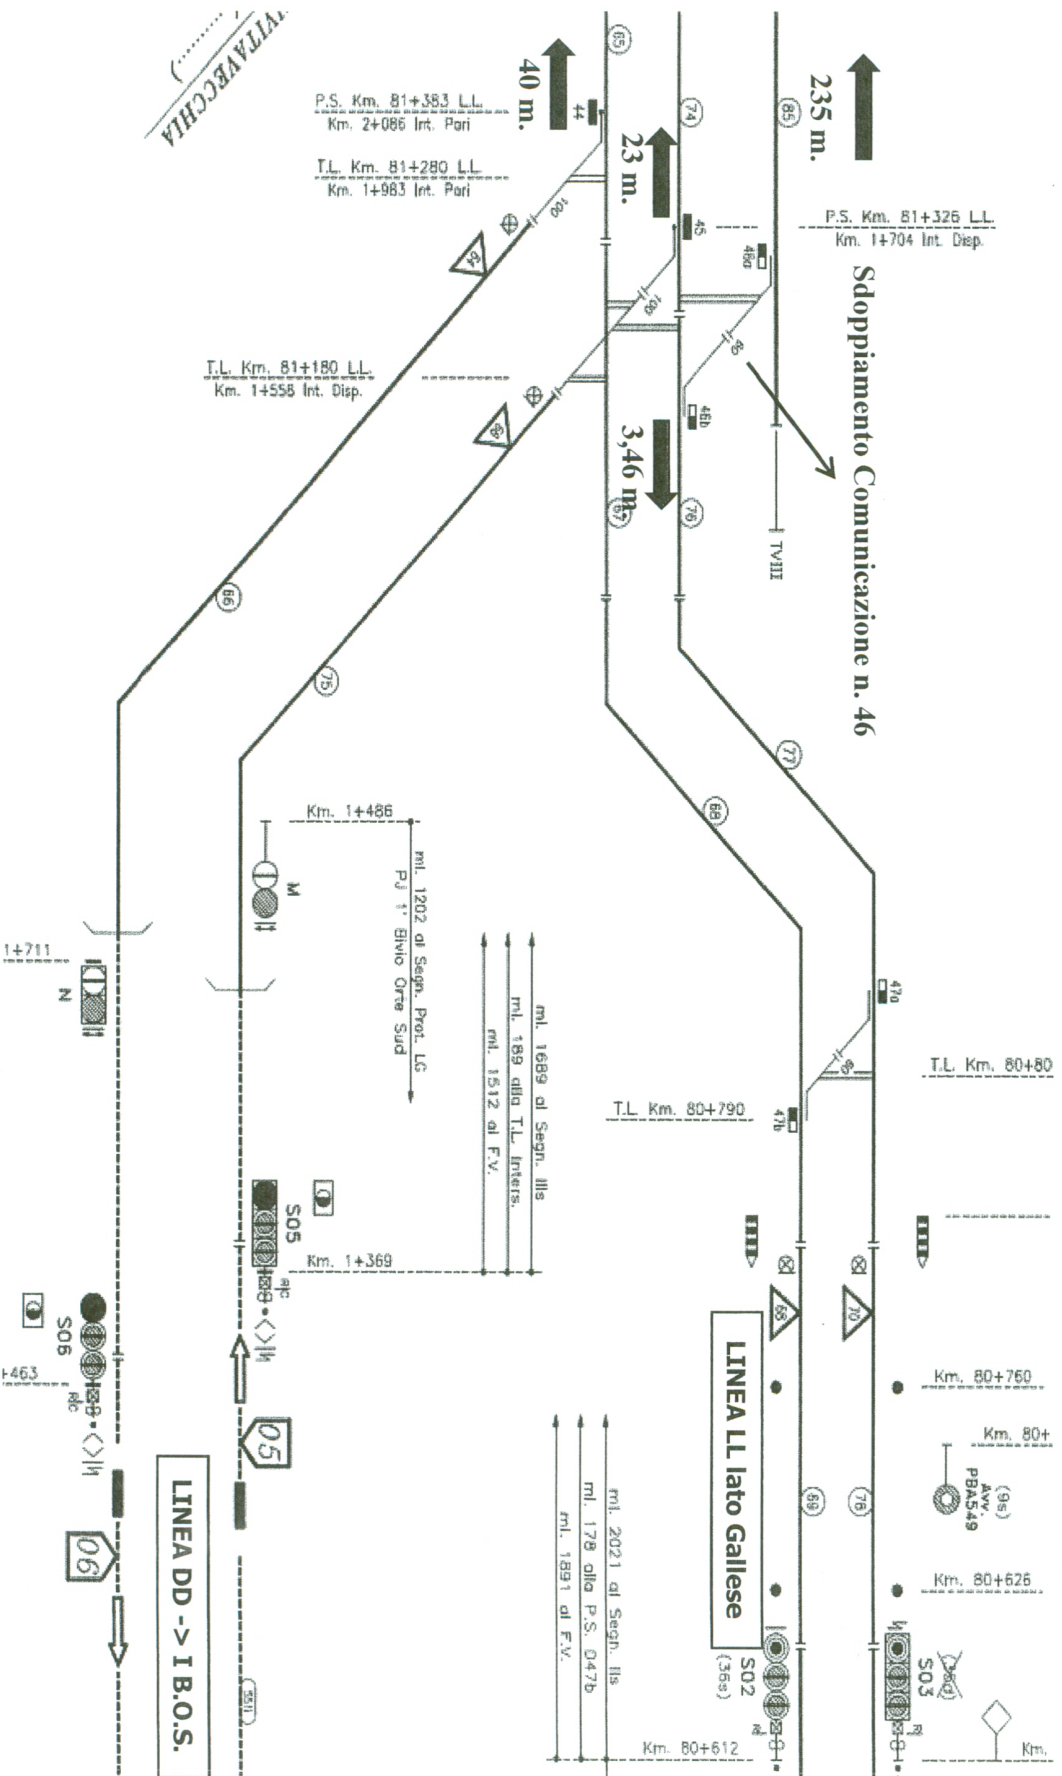

R.U.T. Andrea TELERA

ULTERIORI ADEGUAMENTI TECNICI

Ulteriori adeguamenti Tecnici:

- 1) Modifica palificazione TE nella zona interessata dai lavori
- 2) Modifiche IS Cabina / Piazzale per l'attrezzaggio dei nuovi Deviatori 44 e 45 con manovra oleodinamica di tipo S.O. 1 per Deviatori con tangente 0,040

PROGRAMMA LAVORI

Programma Lavori:

Inizio: notte Gio/Ven 18/19 Luglio 2013

Fine : notte Lun/Mar 05/06 Agosto 2013

con fermo Cantiere dal 26 al 28 Luglio 2013

Notti interessate ai fine settimana:


- | | |
|------------|------|
| 1) Ven/Sab | n. 3 |
| 2) Sab/Dom | n. 2 |
| 3) Dom/Lun | n. 2 |

INTERRUZIONI


Necessità Interruzioni:

- 1) n. 12 interruzioni tra:
 - 1a)** binari Pari e Dispari della durata di 5,5 ore dalle ore 23.30 alle ore 05.00 (contemporanee)
 - 1b)** binari Dispari e Indipendente (IV binario) della durata di 5,5 ore dalle ore 23.30 alle ore 05.00 (contemporanee)
- 2) N. 2 Interruzioni Binario Pari e Dispari e LL è Dispari DD della durata di 14 ore dalle ore 23.10 alle ore 13.00 (contemporanea di 11 ore fino alle ore 09.00)

INTERRUZIONI TIPO 1a

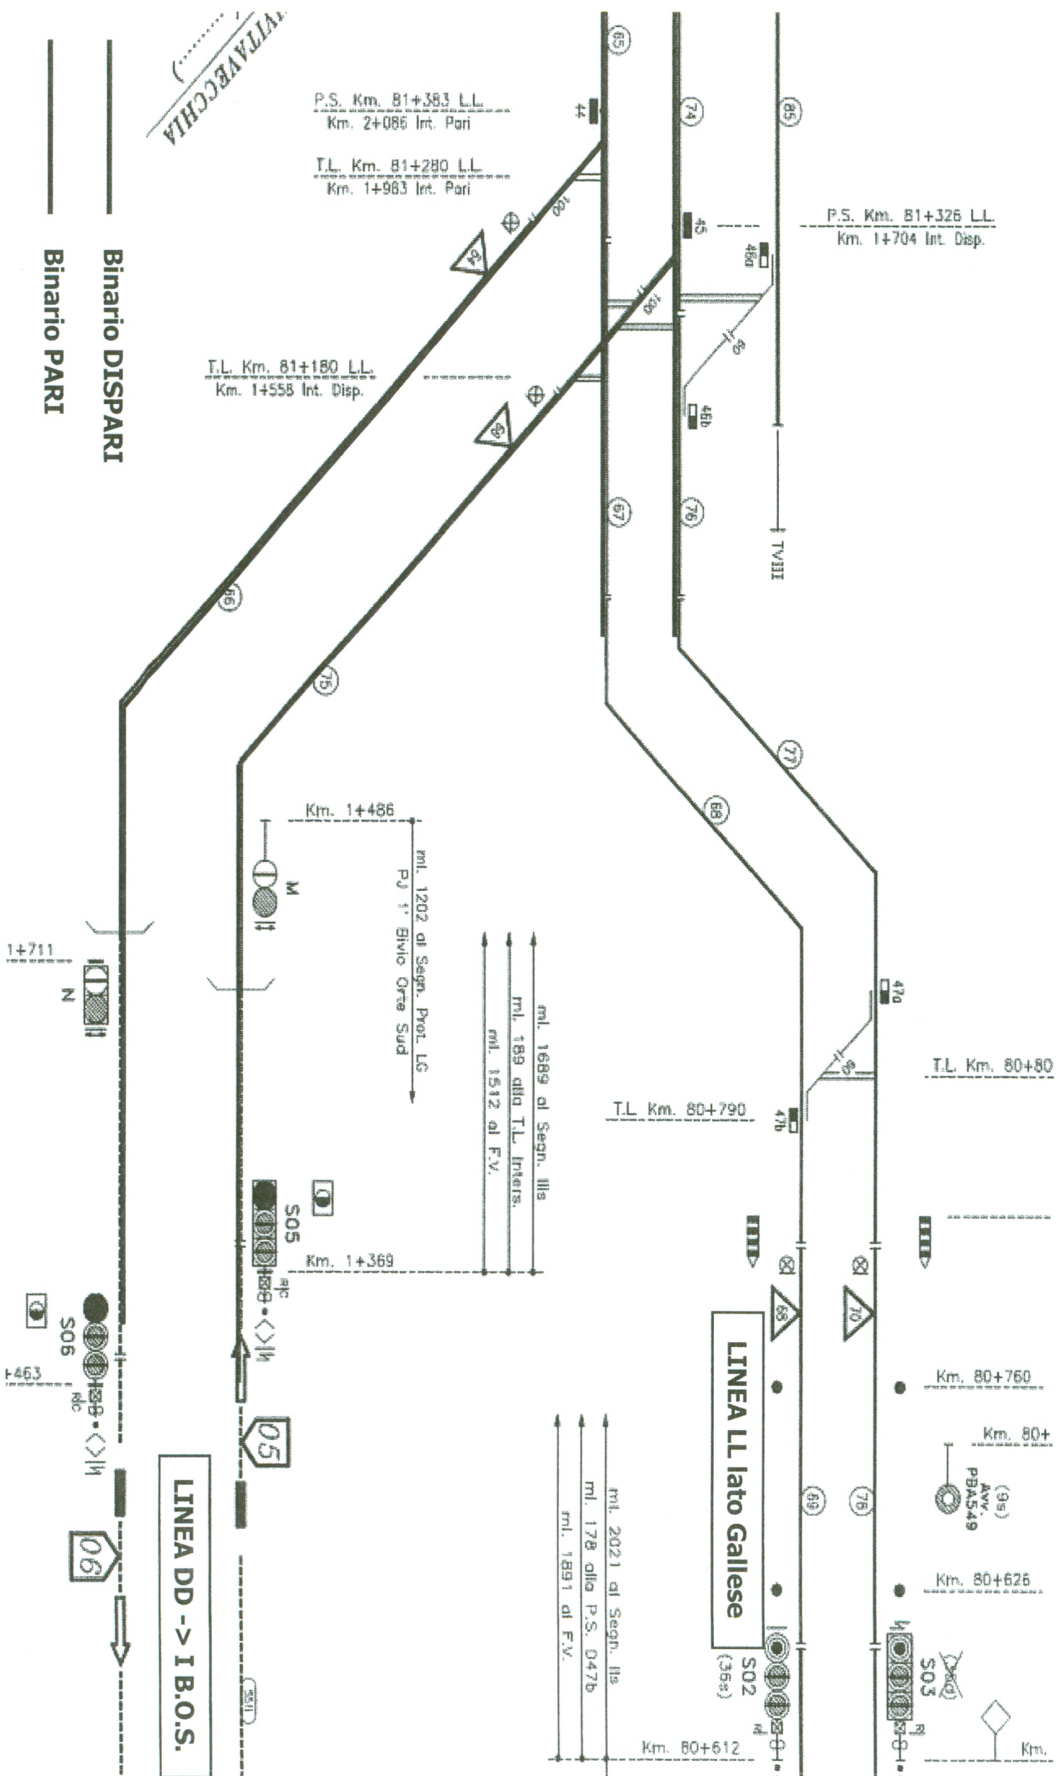

INTERRUZIONI TIPO 2

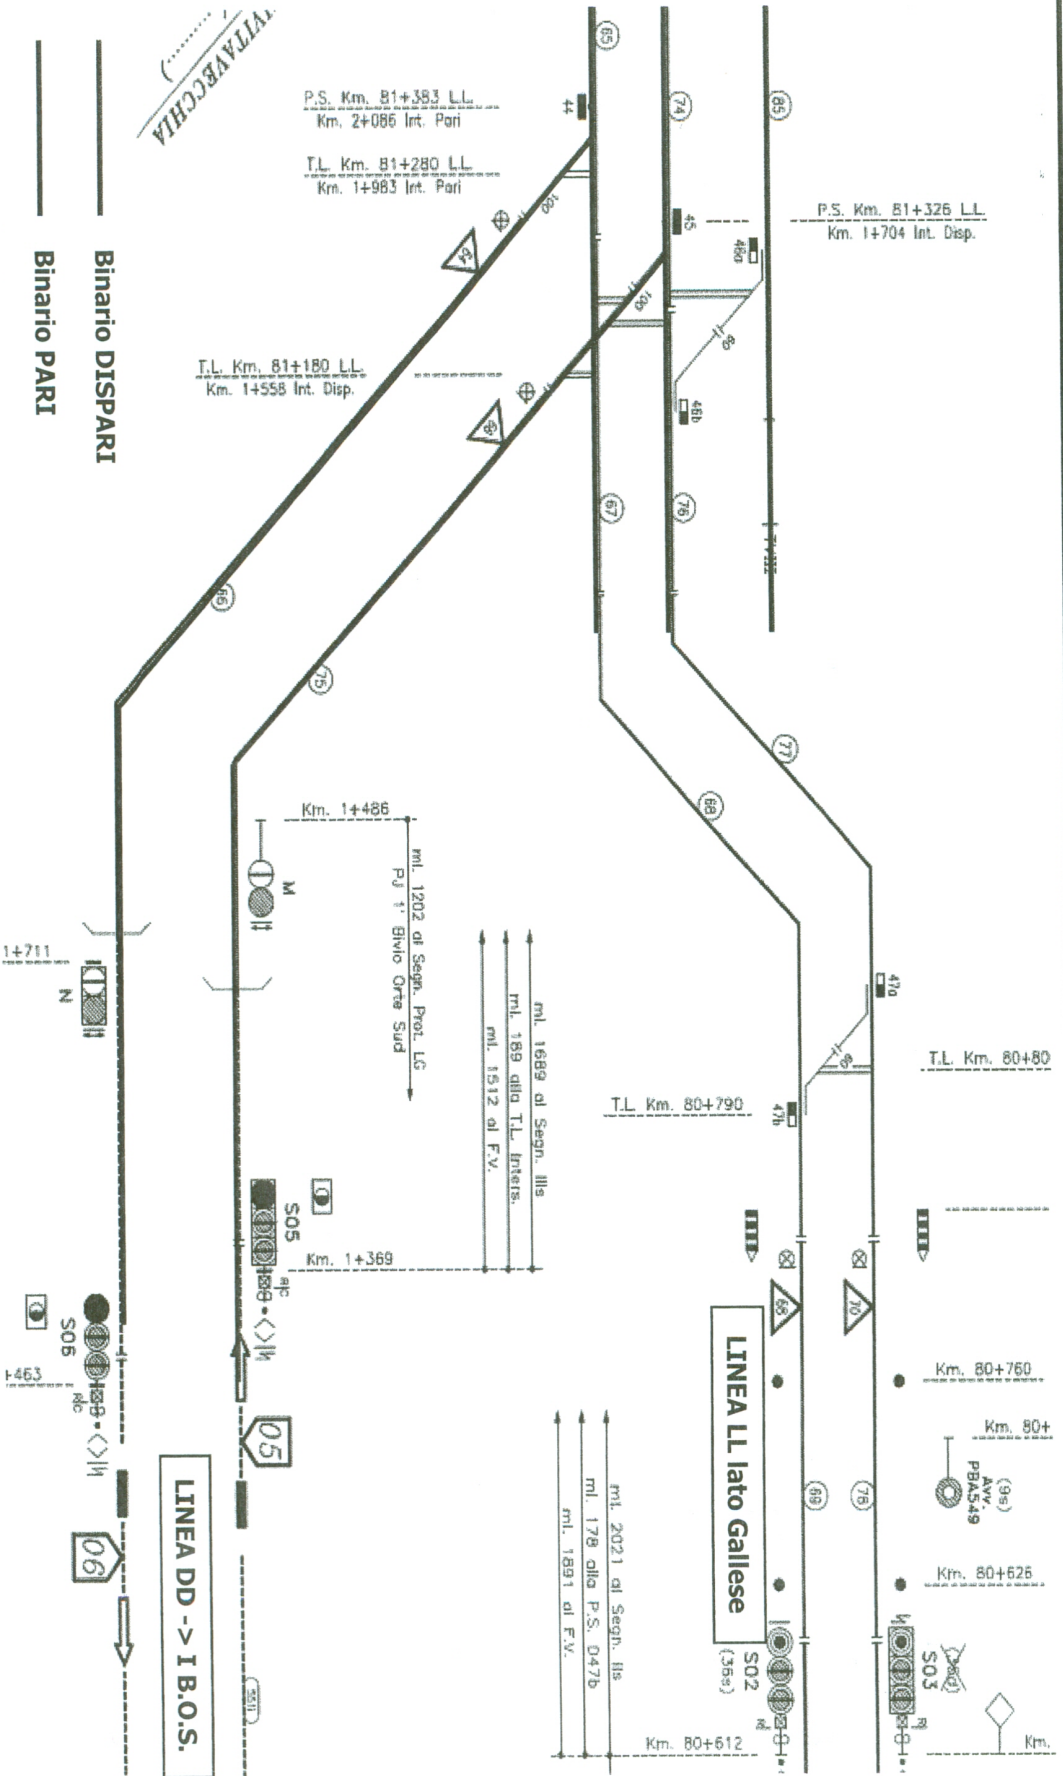

TURNI DI LAVORO

Turno 1:
- 22.00 – 05.36

Turno 2:
a) 20.00 – 03.36
b) 03.00 – 10.36
c) 10.00 – 17.36

Attività	Notte	Giorno Settimana	Tur no	Agenti LV	Agenti altri C.d.L.
Adeguamento nuovo tracciato binario pari	18/19 e 19/20 Luglio	Gio/Ven - Ven/Sab	1	3 LV09	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Varo deviatolo 44 binario pari	20/21 Luglio	Sab/Dom	2	a: 3 LV09 + 2 LV10 b: 2 LV09 + 1 LV10 c: 3 LV09 + 2 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Lavori accessori al varo dev. 44	21/22 Luglio	Dom/Lun	1	3 LV09	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Varo deviatolo 46a bin. Indipendente	22/23 Luglio	Lun/Mar	1	3 LV09 + 2 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Adeguamento nuovo tracciato binario dispari	23/24 e 25/26 Luglio	Mar/Mer - Gio/Ven	1	3 LV09	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Varo deviatolo 4b/6a bin. III dispari	29/30 Luglio	Lun/Mar	1	3 LV09 + 2 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Lavori accessori al varo dev. 4b/6a	30/31 Luglio	Mar/Mer	1	3 LV09	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Lavori accessori nuovo tracciato IV bin.	31/01 Agosto	Mer/Gio	1	1 LV09 + 1 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Rimozione deviatolo 46a, nuovo posizionamento bin. IV realizzazione nuove campate.	01/02 e 2/3 Agosto	Gio/Ven - Ven/Sab	1	3 LV09 + 1 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Attività varo dev. 45 e comunicaz. 46	03/04 Agosto	Sab/Dom	2	a: 3 LV09 + 2 LV10 b: 2 LV09 + 1 LV10 c: 3 LV09 + 2 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
Attività complementari ai vari	04/05 e 05/06 Agosto	Dom/Lun - Lun/Mar	1	3 LV09 + 1 LV10	n. 2/3 TE07 + TE08 n. 2/3 IS07
