RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 29/9/2011
RFI-DPR-DTP_FI.GOT.UN\A001
1\P\2011\0000313

1861 > 2011 > >

Direzione Produzione
Direzione Territoriale Produzione Firenze
Gestione Operativa Territoriale
Unità Terr.le Firenze Nodo
Il Responsabile

SEGRETERIE REGIONALI
FILT/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI
UGL - ORSA – FAST
LORO SEDI

Ai Componenti R.S.U. 16
FIRENZE NODO

Oggetto: Invio verbale.

Per opportuna conoscenza si invia il verbale della riunione tenutasi il giorno 28 settembre 2011 presso questa sede, relativa all'esame del programma delle lavorazioni dell'Unità Territoriale Firenze Nodo per i mesi di ottobre e novembre 2011.

Andrea Fratesi

S.Baggiani/2318

VERBALE DELLA RIUNIONE TRA UNITA' TERRITORIALE FIRENZE NODO E R.S.U. 16/ OO.SS TENUTASI A FIRENZE IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2011 CON IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
O.d.G.: 1 – ESAME PROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI DELL'UNITA' TERR. FI NODO

Per RFI:
Ing. Andrea PRATESI
Fiorangelo ZAMPELLI
Lorenzo MONCINI
Mario DOLENTI
Paolo MASCALCHI

Per RSU 16 FIRENZE NODO:
Roberto BIAGIOLI
Fausto BORGHERINI

Per OO.SS:

Antonino ROCCA	FIT/CISL
Giandomenico D'ANGELO	FIT/CISL
Franco FRATINI	FIT/CISL
Leonardo MUGNAINI	UILT
Daniele AGOSTINI	ORSA
Marco CHELLINI	FILT/CGIL
Federico ZAGATI	FILT/CGIL

Il Capo Unità consegna alle OOSS/RSU la programmazione, allegata al presente verbale, illustrando le principali lavorazioni previste ed in corso di realizzazione per il mese di Ottobre e Novembre, nella giurisdizione dell'U.T. Firenze Nodo.
La prima lavorazione è quella relativa all'allaccio definitivo del passante merci sulla linea Firenze-Prato DD che si concluderà la notte 29/30 ottobre con interruzione puntuale.
Tale intervento comporta prima una serie di interruzioni diurne e notturne per lavorazioni propedeutiche, successivamente lavori di completamento e finitura.

Viene illustrata l'altra lavorazione rilevante riguarda la Galleria del Pellegrino Linea Firenze-Roma DD (via Statuto), prevista nei mesi di ottobre e novembre con interventi riguardanti il risanamento della massicciata e la canalizzazione delle acque meteoriche su venticinque interruzioni notturne.

Vengono quindi illustrati gli altri interventi di cui al programma allegato.

Le lavorazioni suddette saranno eseguite nel rispetto delle normative contrattuali e di Legge. La pianificazione di dettaglio verrà fornita nei termini previsti.

Le Rappresentanze sindacali non firmano il presente verbale e consegnano nota allegata.

Firenze 28 settembre 2011

Per RFI

NOTA A VERBALE DEL 28 SETTEMBRE 2011 U.T. FIRENZE NODO

Le OO.SS. /R.S.U. vista la totale mancanza di risposte da parte aziendale, sulle richieste più volte reiterate di copertura dei posti di lavoro vacanti in particolare da Capo Tecnico (livello D) e Primo Tecnico (livello E), ed in considerazione del programma di lavoro presentato sono a dichiarare la loro indisponibilità a concordare le lavorazioni.

Le OO.SS. / R.S.U. pertanto ribadiscono che nelle attuali condizioni di gravi carenze di personale vi sia il rispetto di tutte le norme contrattuali e di tutti gli accordi in essere per il settore manutenzione nonché degli orari di lavoro. I lavoratori inseriti in turni di reperibilità non possono essere utilizzati nelle lavorazioni presentate.

RSU 16

FIT-CISL

OOSS

FILT CGIL

FIT-CISL

UILT-UIL

ORSA.

#1715 P.004 /004

GANTT COSS UT-FN-Planif-Ott-Nov 2011

ID	Linea	Tratta o Località	Int.ni Ottobre	Int.ni Novembre	AGENTI	Nome attività	Inizio	Fine
19	Firenze SMN-Prato DD	FI Rifredi - FI Castello	diurne e n° 20 notturne durata 240		LV n° 2 IS n° 3/5 TE n° 2/4	Scavalco Firenze Rifredi - Firenze Castello - Allaccio definitivo passante merci su linea DD . Lavori TE-IS-LV	gio 11.08.11	lun 31.10.11
23	Firenze SMN-Prato DD	FI Rifredi - FI Castello		diurne e n° 14 notturne durata 240	LV n° 2/4 IS n° 1/2 TE n° 2/4	Lavori di completamento Scavalco Firenze Rifredi - Firenze Castello - Allaccio definitivo passante merci su linea DD . IS (n°6 int) /TE (n° 14 int) / LV (n°6 int)	mar 01.11.11	sab 31.03.12
21	Firenze SMN-Prato DD	FI Rifredi - FI Castello		diurne e n° 1 notturne durata 300	LV n°10 IS n° 10 TE n° 8	PUNTUALE Scavalco Firenze Rifredi - Firenze Castello - Allaccio definitivo passante merci su linea DD . Impegno previsto dalle 20.00/04.00	sab 29.10.11	dom 30.10.11
8	Firenze SMN-Prato DD	FI SMN		diurne e n° 12 notturne durata 240	LV n° 2/5 IS n° 1/2 TE n° 2/4	Rinnovo del dev con posa in legno, sostituzione di n° 3 deviatoi a FI SMN 49a - 49b - 47a	mar 01.11.11	lun 26.12.11
10	Firenze SMN - Prato DD	FI SMN	notturne n° 15 durata 240	notturne n° 5 durata 240	IS n° 2	Riscaldamento Elettrico deviatoi di FI SMN + rinnovo quadri comando e controllo RED	lun 13.06.11	mer 09.11.11
31						**Firenze - Pisa**		
114	Firenze - Pisa	Bivio Samminiatello - Biv Renai storica	diurne e n° 4 notturne durata 240		TE n° 3	Lavori TE sost. pali n° 15 vetusti	mer 19.10.11	mer 30.11.11
111	Firenze - Pisa	Bivio Samminiatello	notturne n° 12 durata 240		TE n° 3/4	Trasformazione LDC sezione da 320 FF a 320 mmq FR ambito Bivio Samminiatello	mar 04.10.11	lun 17.10.11
47						**Firenze - Prato - Pistoia LL**		
55	FI-PO-PT	FI Castello	diurne	diurne	LV n° 1/4 IS n° 1/2	Scalo merci Castello,costruzione 4 nuove aste fascio merci lato Prato (n°2 per ricovero carrelli DTP Bologna- n°2 per ricovero carrelli Cantiere meccanizzato DTP Firenze) con rinnovo 2000 m. binario	sab 01.10.11	ven 16.12.11
38								
64						**Firenze - Roma DD (via Statuto)**		
76	Firenze - Roma DD	FI C.Marte - Statuto	n° 20 notturne durata 240	n° 5 notturne durata 240	LV n° 5/8 IS n° 3/8 TE n° 2/4	Risanamento e sistemazione curetta centrale galleria Del Pellegrino (solo per le prime 10 int. di risanamento è interessato pers ag. IS)	lun 03.10.11	mar 15.11.11
77	Firenze - Roma DD	Firenze Statuto		n° 4 notturne durata 240	LV n° 3/5 IS n° 3/5 TE n° 2/4	demolizione n° 2 deviatoi DD + LL: 13a - 13b/14 in articolo 8, con avvisi FS a sistema	mar 01.11.11	lun 14.11.11
115						**Montepescali - Siena**		
121	Empoli - Siena	Montepescali - Siena	Quasi totalmente lavorazioni diurne - notturne n° 2		IS n° 1	Realizzazione GSM-R	mer 26.05.10	sab 15.10.11
122						**Empoli - Siena**		
127	Empoli - Siena	Empoli - Siena	Quasi totalmente lavorazioni diurne - notturne n° 2		IS n° 1	Realizzazione GSM-R	mer 26.05.10	sab 15.10.11
123	Empoli - Siena	Empoli - Siena		diurne e n° 4 notturne durata 240	LV n° 2/4 IS n° 1/2	Rinnovo pavimentazione n°1 PL Km 308+667	mar 08.11.11	mer 30.11.11
150	Empoli - Siena	Empoli - Siena	Quasi totalmente lavorazioni diurne - notturne n° 2		IS n° 2	INFILL Granaiolo- Badesse-Ponte a Elsa	lun 01.08.11	lun 26.12.11

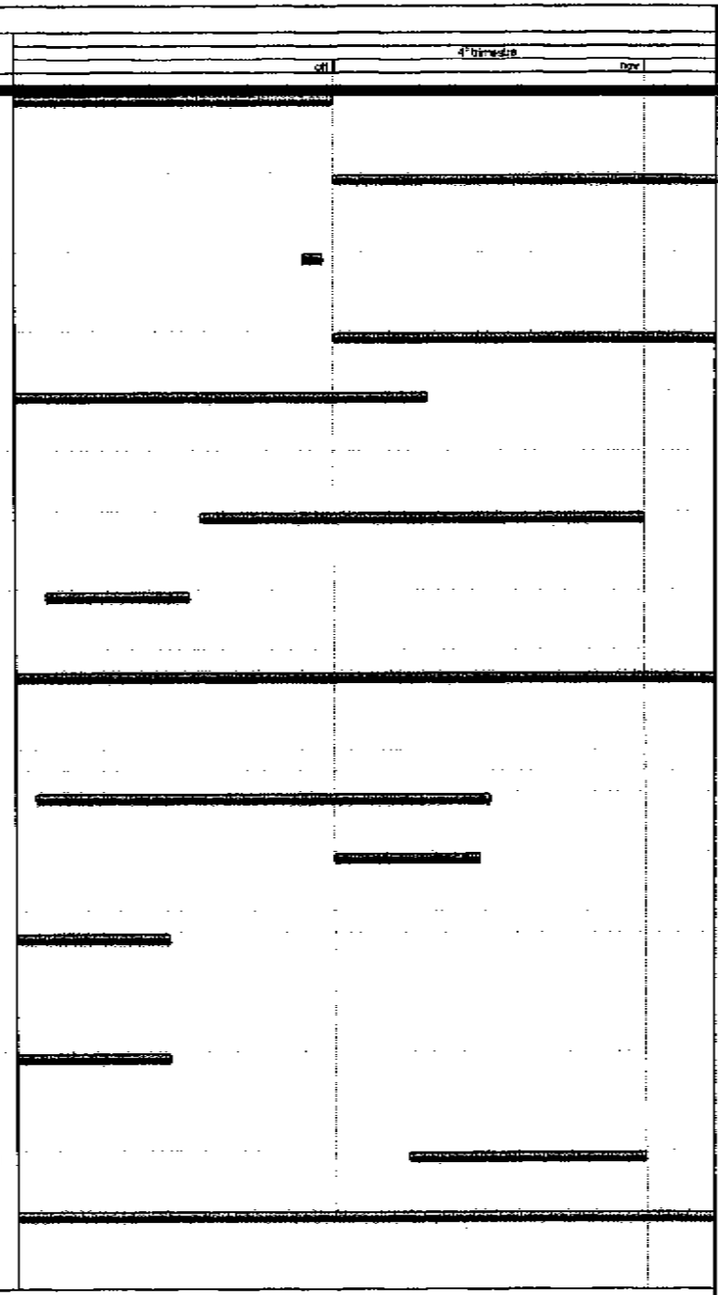

29.SET.2011 13:31
