

VERBALE dell'incontro tenuto il 6 maggio 2016 a Milano tra RFI S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo e Personale e Organizzazione Milano e le Segreterie Regionali Lombardia delle Organizzazioni Sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA FERROVIE e la RSU n. 2 Milano Produzione.

Ordine del giorno: Programmi attività nel 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Nodo.

Nel corso dell'incontro la Società illustra i programmi delle attività del 2° quadrimestre 2016 dell'Unità Territoriale Milano Nodo.

Nell'illustrazione delle lavorazioni sono stati evidenziati i tempi di attuazione, le risorse da utilizzare e l'articolazione dell'orario di lavoro.

Le lavorazioni in questione sono illustrate nelle schede di cui è consegnata copia a tutti i presenti ai vari incontri.

Le parti nello specifico delle lavorazioni concordano quanto segue:



1. Le schede allegate delle attività sono parte integrante del presente verbale.
2. I turni riguardanti le lavorazioni notturne saranno esposti dai Capi UM il lunedì/martedì, per poi trovare conferma il venerdì precedente la settimana d'inizio delle lavorazioni.
3. L'inizio della lavorazione sarà preceduto da un'informazione tecnica tenuta dal Capo UM/Specialista Cantieri interessato, nella quale saranno evidenziate le peculiarità dell'intervento.
4. I lavoratori inseriti nei turni di reperibilità non saranno inclusi nelle attività notturne.
5. La terza notte non consecutiva sarà programmata una volta ogni 4 settimane (vedi art. 28 punto 1.9 del C.C.N.L.) come da schede lavorative allegate.
6. Eventuali modifiche delle attività illustrate saranno portate a conoscenza delle R.S.U. tempestivamente rispetto alla loro realizzazione e in considerazione dell'aspetto organizzativo che si verifica.
7. Al personale tutto verrà garantito il godimento delle ferie già programmate.
8. In caso di necessità, si attueranno sinergie di personale da altri Nuclei limitrofi dell'UM di giurisdizione (come da schede allegate).
9. Il personale sarà utilizzato per un solo fine settimana oltre a quello chiaramente già previsto dal turno di reperibilità.
10. Il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio, con rimborso KM e copertura Kasko, sarà preventivamente autorizzato dal Capo Unità, entro un'ora prima e un'ora dopo, che esaminerà in special modo le situazioni di assenza dei mezzi pubblici e di prestazioni notturne effettuate, in particolare, fra sabato e domenica e fra domenica e lunedì; nel limite dello spazio temporale di un'ora prima e dopo la prestazione.

Milano, 6 maggio 2016


Per RFI S.p.A.



Per le Segreterie Regionali

FILT/CGIL 
FIT/CISL 
UILTRASPORTI 
UGL Trasporti 
FAST Ferrovie 
ORSA Ferrovie 

Per la R.S.U.



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

MAGGIO-AGOSTO 2016

Elenco attività

1. MILANO P.GARIBALDI: Rimozione curve contrapposte
2. MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
3. MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti
4. MILANO LAMBRATE: Manutenzione straordinaria armamento
5. ~~TRIPLO BIVIO SEVESO: Manutenzione straordinaria armamento~~
6. MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
7. VARIE TRATTE NODO: Rinnovo binario
8. TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord
9. TORINO - PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest
10. MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
11. MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE
12. MILANO SMISTAMENTO: Modifiche per scissione da FS Logistica *
13. MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento
14. ~~VITTUONE - Posa a nuovo 2 Deviatori conto progetto TO/PD~~
15. MILANO CENTRALE - Ristrutturazione cabina C
16. MILANO CERTOSA EXPO' 2015: realizzazione sottopasso stradale collegamento Zara-Expò *
17. Tratta ALBAIRATE - ABBIATEGRASSO, Manutenzione ponte sul Naviglio
18. MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale
19. PASSANTE: Ricambio rotaie
20. MILANO CENTRALE: Rinnovo TE
21. CORBETTA SANTO STEFANO TICINO: soppressione p.l. 123+635 monolite 123+750
22. PASSANTE: attività cicliche impianti l.f.m., ventilazione, aggotamento, idrici antincendio *
23. PASSANTE e galleria MIRABELLO: attività cicliche ed su condizione impianti ingrassatori rotaie *
24. RHO: marciapiedi H55
25. TRATTA MI. ROGOREDO - PJ MELEGNANO: sostituzione g.i.i. e regolazione l.r.s.
26. VIGEVANO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso + rifacimento 1° binario. *
27. PASSANTE: sostituzione porte tagliafuoco. *
28. Tratte e località di Giurisdizione UMTE2 Milano Lambrate: lavorazioni internalizzate TE
29. MILANO GRECO PIRELLI: manutenzione straordinaria all'armamento

Fitcisi
Agui
...

[Numerous handwritten signatures and initials in blue ink]

1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

MAGGIO-AGOSTO 2016

1	MILANO P.GARIBALDI: Rimozione curve contrapposte
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività nel trimestre (aprile-maggio-giugno) in oggetto consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spostamento enti interferenti – modifiche TE (Maggio/10 giugno 20 notti infr) • Correzione di tracciato dei tre binari di circolazione (Settembre) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale TE sarà impegnato in scorta mezzi d'opera, assistenza e controllo.</p> <p>Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 5/6 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. a seconda degli enti interessati</p> <p>A seconda della lavorazione è previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), TE (2/3 Ag) e sporadicamente IS (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Attività da compatibilizzare con le lavorazioni della scheda 7 in alternativa alla scheda 11</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S

2	MILANO CENTRALE: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 3 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 7 e 20. La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione. Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 30 circa
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

2

fit esse

Dopo

regolato

FURIA

2

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

3	MILANO CENTRALE: Semplificazione impianti
1	<p>Descrizione attività: SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI</p> <p>Nel 2012 è stato avviato un Piano di Semplificazione degli Asset di Circolazione che rappresenta un processo strategico per la nostra Azienda ed è parte integrante del piano d'Impresa 2014/2017.</p> <p>L'attività consiste nella sostituzione di deviatori con campate di binario e la demolizione di tratti di binario</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni.</p> <p>Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 - 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (3/4 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) previsto nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alle lavorazioni della scheda 2 e dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 7 e 20.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte per il personale Lavori</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 30
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

4	MILANO LAMBRATE: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovamento intersezione 70 (prevista per prima settimana di Maggio) (eseguita)+ deviatori in periodo da programmare in base all'approvvigionamento dei materiali - rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche nell'arco di tutto il periodo in oggetto. <p>Gli oggetti da manuteneare saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo.</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni.</p> <p>Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 - 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Attività da compatibilizzare con la scheda n° 7</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S

fit. crisi
[Signature]

[Signature]

127
[Signature]

FILT

3


[Multiple signatures]


UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016

5	TRIPLO BIVIO SEVESO: Manutenzione straordinaria armamento Attività già conclusa
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in manutenzione ordinaria armamento con sostituzione cuori, revisioni deviatori e intersezioni di T.B. Seveso, interamente svolta nel mese di Aprile con eventuale recupero per ultimazioni ad inizio Maggio L'attività sarà eseguita con personale LV sarà impegnato, IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni e all'occorrenza il personale TE Per tali attività sono previste interruzioni notturne tra il L/M e V/S (non più di 3 notti alla settimana) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (puntualmente 2 Ag) dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 2 V/S







6	MILANO CERTOSA: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinnovo n° 3 deviatori (41a, 41b, 89a) n°1 scambio/intersezione (74B/72B) n°1 intersezione (80/87) (maggio) - revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche nell'arco di tutto il periodo; (lavoro da compatibilizzare con punto 7) <p>Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo.</p> <p>L'attività sarà eseguita con la ditta appaltatrice, il personale LV, TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Possibilità di ricorso alla terza notte;</p> <p>lavoro da compatibilizzare con punto 7</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S

FILU 



FILU 

4 | 

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**







7	TRATTE VARIE: Rinnovo binario
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rinnovo di diverse tratte di binario - T.B. Seveso – Milano Certosa (linea CINTURA) dal 12 giugno al 15 luglio - Tratte: Milano Centrale – Milano Certosa (linea VIAGGIATORI) dal 15 luglio al 5 agosto e dal 22 agosto al 15 settembre - Milano Lambrate (i) – Milano Greco Pirelli (i) (linea NUOVA MERCI) dal 15 settembre al 15 novembre <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) e 2 D/L della durata di circa 5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (5/8 Ag), IS (3/5 Ag) e TE (2/3 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi delle altre U.M. IS dell'U.T. Nodo Sarà utilizzato anche personale dell'U.M. LV Milano Certosa e successivamente dell'U.M. LV di Milano Rogoredo</p> <p>Lavorazione prevista anche notte del 29 Giugno.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 53
3	Interruzioni puntuali: n° 2 D/L
4	Fine settimana: n° 11 V/S





WILT
 PA
 FIAA
 FAP
 FIT CISEL
 [various other signatures and initials]

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

8	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Nord
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.</p> <p>Fase 2.4 Nodo di Milano ACC di Milano greco In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi; - Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM sull'intero piazzale di Milano Greco; - Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA nord e sud); GA Nord ristrutturazione dell'attuale fabbricato ex ferro hotel. - Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti STSI - Impianto GbE; <p>Fase 2.5 Nodo di Milano PPM di Sesto S.G. (Settembre) In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi; - Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.1 fabbricato) - Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM sull'intero piazzale di Milano Greco; - Lavori di posa cavi TT a f.o. principale e secondario in canalizzazioni predisposte da IS e/o esistenti - Impianti STSI - Impianto GbE; <p>Le attività anche contemporaneamente con un limite massimo di 3 cantieri a notte.</p> <p>Impegno medio di personale Nuclei IS/TE/LV (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 60 dalle 23,30 alle 4,30 a seconda delle linee interessate
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 15 V/S

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

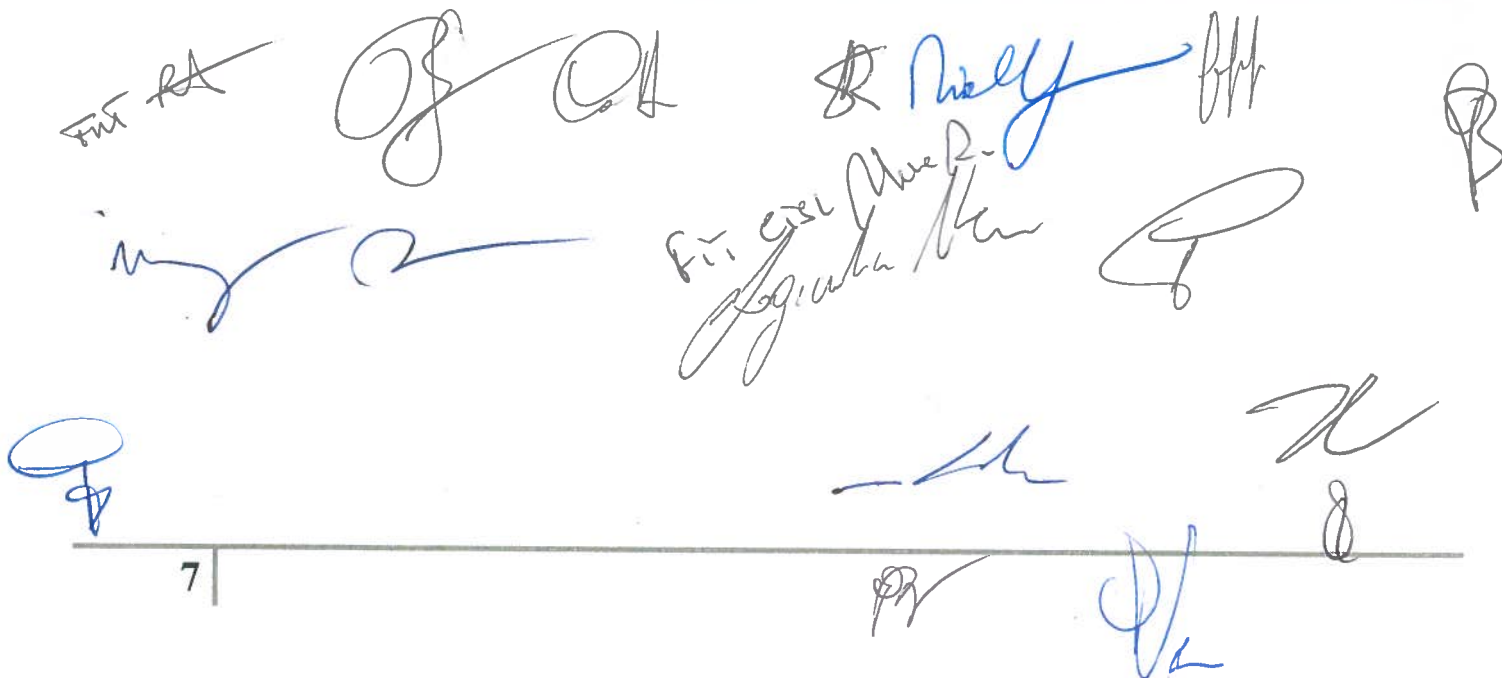





UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

MAGGIO-AGOSTO 2016

9	TORINO – PADOVA: Potenziamento tecnologico Nodo Ovest
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino – Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi di realizzazione impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica.</p> <p>Fase 6.1 Linea Torino – Vittuone - Magenta In questo periodo è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cantierizzazioni, misurazioni e sopralluoghi; - Lavori di posa canalizzazioni, polifore in attraversamento binari, cavi e enti e apparecchiature IS/LFM - STSI - GbE nelle stazioni di Magenta e Vittuone; - Costruzione dei fabbricati GA per il contenimento delle apparecchiature ACC (n.2 GA Vittuone e Magenta); Magenta ristrutturazione dell'attuale fabbricato magazzino merci. - Lavori di posa canalizzazioni e cavi TT a f.o. principale e secondario, nelle tratte Rho Vittuone – Magenta – Trecate, per impianti di blocco eRSC e TLC; <p>Le attività anche contemporaneamente con un limite massimo di 3 cantieri a notte. L'attività è iniziata e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo in oggetto.</p> <p>Impegno medio di personale Nuclei IS/TE/LV di giurisdizione (mediamente 2 Ag ad interruzione) titolare dell'interruzione, scorta mezzi d'opera, controllo lavori.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 60 dalle 23,30 alle 5,00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 15 V/S



7 |

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016

10	MILANO LAMBRATE: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo - Alzamento pali e portali e travi MEC - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. - Rinnovo condutture di contatto <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S L'attività è in corso e sarà conclusa/sospesa entro 15 giugno.</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 24 fra le ore 23:30 e le ore 5:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 6 V/S

11	MILANO PORTA GARIBALDI: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifica schema di alimentazione con realizzazione di nuovi sezionamenti - Posa segnaletica TE - Rinnovo condutture di contatto - Modifica TE conseguenti a variazione di tracciato binari per risoluzione curve contrapposte (scheda n°1) <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S con ditta appaltatrice Il Lavoro in oggetto riprenderà al termine di tutte le lavorazioni previste nella scheda 1. (Giugno) e sarà compatibilizzato con le lavorazioni della scheda 7</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 23:30 e le ore 4:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 10 V/S

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

12	MILANO SMISTAMENTO – Modifiche per scissione da FS Logistica
1	<p>Descrizione attività: SEMPLIFICAZIONE IMPIANTI Tale attività prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosecuzione modifiche all'armamento al fine di separare la proprietà RFI dalla proprietà di FS Log. - Realizzazione nuove canalizzazioni, posa nuovi cavi e enti IS di piazzale (attività diurna infrasettimanale) - Attività in cabina (attività diurna infrasettimanale) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Inoltre il personale IS sarà impegnato in assistenza Ditta e modifiche agli apparati di Cab. M e Cab "D" L'attività è in corso e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo in oggetto in alternativa alla scheda 13.</p> <p>L'attività vede l'impegno di personale LV (3/4 Ag), IS (2/4 Ag) e sporadicamente TE (2Ag),</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: no
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana:

13	MILANO SMISTAMENTO: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività con personale LV e con possibilità sussidio impresa appaltatrice, il personale sarà quindi impegnato in eventuale scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. L'attività è in corso e sarà svolta nell'arco di tutto il periodo con attività diurne, e puntualmente notturne (L/M – V/S) e S/D in oggetto in alternativa alla scheda 4 e 12.</p> <p>È previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/4 Ag) e TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Prevista 3^ Notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 32
3	Interruzioni puntuali: n° 4 S/D e 4 D/L
4	Fine settimana: n° 4 V/S

FSR RT

9

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

14	VITTUONE – Posa a nuovo 2 Deviatori conto progetto TO/PD Rinviata al 2017
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Nell'ambito del progetto di potenziamento tecnologico della Torino Padova è previsto un nuovo piano regolatore della stazione di Vittuone. Attività già realizzata tranne la posa in opera di una comunicazione composta da 2 deviatori 0074. L'attività verrà eseguita nel mese di Maggio/Giugno.</p> <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di circa 5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00.</p> <p>L'attività è svolta con impegno notturno infrasettimanale di 3/5 Ag LV, 2 Ag TE., 2 Ag IS Per tale attività è previsto impegno di personale dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM Previsto ricorso alla terza notte.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana e festivi: 2 V/S

15	MILANO CENTRALE – lavori di sistemazione Cabina C
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE L'attività prevede la ristrutturazione della cabina C di Milano Centrale, verrà chiesta interruzione puntuale continuativa di 36 ore per il mese di Agosto Le attività da eseguire e le relative modalità sono da definire. Possibilità di interruzioni notturne nella fascia 00.00 /5.00 tra L/M e V/S</p> <p>Per tale attività è previsto impegno di personale dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM; verrà utilizzato personale LV – TE del nucleo di competenza. Da compatibilizzare con scheda 2 e 3. Possibilità di sfruttare l'interruzione puntuale continuativa di 36 ore per manutenzione straordinaria.</p> <p>Attività in attesa di autorizzazione Direzione Commerciale</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi dell'U.M. di Milano P.G. per trasferimento m.d.o. da Milano P.G. a Milano Centrale (per 2 notti)</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: da definire
3	Interruzioni puntuali: si
4	Fine settimana: V/S da definire


10


Handwritten signatures and notes:
 - "Fittesi" (written vertically)
 - "Agosto" (written vertically)
 - "2" (written in blue ink)
 - "P. G." (written in blue ink)
 - "Nuclei" (written in blue ink)
 - "P.G." (written in blue ink)
 - "L. G." (written in blue ink)


**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

16	MILANO CERTOSA EXPO' 2015 – realizzazione sottopasso stradale collegamento Zara-Expò
1	<p>Descrizione attività: ATTIVITA' CONTO TERZI EXPO 2015 ha previsto la modifica del sistema viario di accessibilità all'esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS11 con la SS233 (Expò-Eritrea). Questo collegamento è stato realizzato con un sottovia mediante la spinta di due monoliti affiancati che attraverseranno tutto lo scalo di Milano Certosa in corrispondenza dello scavalco di Fiorenza Nel periodo in esame sono previste le seguenti attività: - Lavori di completamento sulla rete 23KV e sistemazione binari lato scalo</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M- G/V: 5
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no

17	Tratta ALBAIRATE – ABBIATEGRASSO, Manutenzione ponte sul Naviglio
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Manutenzione puntuale con impermeabilizzazione del ponte; rimozione binario e massicciata sul ponte, intervento di impermeabilizzazione e successiva ricostruzione del binario.</p> <p>Interruzione puntuale continuativa di almeno 48 ore (dal venerdì sera 5 agosto a lunedì mattina 8 agosto) con impegno massimo di 6 Ag LV, 2 Ag TE, 2 Ag IS nella notte v/s e d/l, da sabato mattina a domenica sera presenziamento h24 continuo con articolazione d'orario dalle ore 6:00 di sabato 6 agosto alle ore 22 di domenica 7 agosto (2 mattine, 2 pomeriggi, 1 notte) di 2 Ag RFI</p> <p>Previste anche notti infrasettimanali (l/m-v/s) propedeutiche e di completamento (10 notti totali), durata 5/6 ore tra le 23.00 e le 5.00 con impegno di 2 Ag LV, 2 Ag TE, 2 Ag IS</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione e all'occorrenza delle U.M. limitrofe.</p> <p>Programma dell'attività ancora da dettagliare</p>
2	Interruzioni medie L/M- G/V: 8
3	Interruzioni puntuali: si - interruzione puntuale da notte Venerdì a mattina Lunedì
4	Fine settimana: 2 V/S

FMT 



Francesi (Chiuso E.)




11





UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO PROGRAMMA ATTIVITA' MAGGIO-AGOSTO 2016

18	MILANO GRECO: Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale con rampe e scale lato nord stazione
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE</p> <p>L'attività prevede la costruzione di un nuovo sottopasso a Nord rispetto all'esistente Nel periodo in oggetto sono previste:</p> <p>Realizzazione micropali L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a G/V (n° 60) e V/S (n°15) con impegno di n° 1/2 Ag LV e 1/2 Ag TE e 1/2 Ag IS per assistenza ditta e disalimentazione l.d.c.</p> <p>Si segnala inoltre la possibilità di alcune modifiche TE all' interno di Milano Greco Pirelli</p> <p>L'attività sarà eseguita da ditta appaltatrice Interruzioni di durata circa 5/6 ore tra le 23.00 e le 5.00 tra la metà di Aprile e la fine di Luglio, proseguimento anche dopo Agosto Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione e degli altri nuclei del UM La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 60
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 15 V/S

19	LINEA PASSANTE: Ricambio rotaie
1	<p>Descrizione attività MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>L'attività sarà eseguita con personale del Tronco Lavori, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni.</p> <p>L'attività si svolgerà con ditta appaltatrice da L/M a V/S tra il mese di maggio fino al 10 giugno, con compatibilizzazione con le attività di cui alla scheda N° 1</p> <p>È previsto un impegno medio di personale LV (2Ag), 2 Ag IS 2 Ag TE per assistenza ditta, scorta M.d.O. e attività IS e TE correlate</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>Prevista terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 8
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 2 v/s

12

Handwritten signatures and notes:
 - "FUT" with an arrow pointing left.
 - "FIRECIS" above a signature.
 - "Mag" above a signature.
 - "Reginal" above a signature.
 - "Mer" above a signature.
 - "OF" above a signature.
 - "Rally" above a signature.
 - "OFF" above a signature.
 - "R." above a signature.

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

20	MILANO CENTRALE: Rinnovo TE
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA Lavorazioni previste nel periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo e getto basamenti palo - Alzamento pali e travi MEC - Attrezzaggio sostegni e spostamento ormeggi sui nuovi pali. - Attrezzaggio sospensioni speciali in tettoia <p>L'attività si svolgerà con interruzioni notturne da L/M a V/S da maggio fino a Luglio</p> <p>È previsto un impegno medio di personale TE (2 Ag), compatibilizzare con schede 2 e 3.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 40 fra le ore 01:00 e le ore 5:00
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 10 V/S

21	CORBETTA: costruzione sottopasso stradale per soppressione p.l. km 123+635
1	<p>Descrizione attività: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE Costruzione delle opere sostitutive per la soppressione del passaggio a livello posti Km 123+635 in Comune di Santo Stefano Ticino della linea Torino-Milano, consistenti in un sottovia carrabile e relative rampe di collegamento alla viabilità esistente sottopassante la sede ferroviaria al Km 123+750 circa.</p> <p>Nel periodo a riferimento sono previste le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino della sede ferroviaria alle condizioni preesistenti al consolidamento (prima quindicina di giugno) - Fase di spinta monolite con rimontaggio ponte (ultimo quadrimestre) <p>Impegno di 4 Ag LV 2 Ag TE e 2 Ag IS.</p> <p>Previste circa 10 interruzioni (L/M-G/V) + 2 (V/S) nella fascia 00.00 fino alle 5.00</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p> <p>All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Prevista terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 10
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 3 V/S










FUTA






[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'FUTA', 'fit eish', and various initials]

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

22	PASSANTE: attività cicliche impianti l.f.m., ventilazione, aggotamento, idrici antincendio
1	<p>Descrizione attività: L'attività prevede la verifica di funzionamento e interventi per il mantenimento dell'efficienza agli impianti luce (normale e di emergenza) e forza motrice, ventilazione, pozzi di sollevamento acque bianche (aggottamento), impianti idrici antincendio della galleria tra Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (i)/Bovisa (e) del PASSANTE Ferroviario di Milano</p> <p>È previsto un impegno medio di personale LV (1Ag) o Ag TE (1Ag) o Ag IS (1Ag) Lo svolgimento di queste attività vede l'impegno di personale dei nuclei manutentivi di giurisdizione La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: 12
3	Interruzioni puntuali:
4	Fine settimana: 3 v/s

23	PASSANTE e galleria MIRABELLO: attività cicliche ed su condizione impianti ingrassatori rotaie
1	<p>Descrizione attività: L'attività prevede la verifica ciclica bimestrale agli impianti di ingrassatura rotaie esistenti nella tratta tra Milano P.ta Rogoredo (e) / Bivio Lambro (e) / Milano P.ta Vittoria (i) e Milano Villapizzone (e) del PASSANTE Ferroviario di Milano</p> <p>Milano P.ta Garibaldi – Bivio Mirabello della linea Milano – Chiasso/Lecco (galleria MIRABELLO).</p> <p>Sono inoltre previsti interventi su condizione per riparazioni e ripristino grasso lubrificante. È previsto un impegno medio di personale LV (1Ag)</p> <p>L'attività sarà eseguita da ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta e assistenza.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: 4
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: no

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

24	RHO: marciapiedi H55
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA</p> <p>Il progetto nazionale denominato "500 stazioni" prevede un intervento nella stazione di Rho che consiste nella realizzazione degli ascensori e l'alzamento H55 di tutti i marciapiedi.</p> <p>Nel quadrimestre in oggetto sono previsti i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cantierizzazione 3 marciapiede (V° binario) attività diurna non interferente con la circolazione treni, fase con interruzioni notturne previste nel mese di Maggio e inizio Giugno, poi da metà Giugno a metà Luglio attività diurne senza impegno RFI con solamente 1/2 notti a settimana - Inizio lavori di costruzione vano ascensore e sistemazione marciapiedi, attività racchiusa in area di cantiere non interferente con la circolazione treni - Cantierizzazione 1 marciapiede (I° binario) attività diurna non interferente con la circolazione treni, fase con interruzioni previste nel mese di Luglio e Agosto (fino al 6 Agosto senza tolte tensioni e senza scorta mezzi d'opera) <p>È previsto un impegno diurno infrasettimanale saltuario del personale LV/TE/IS/TLC per attività di controllo e assistenza.</p> <p>Previste interruzioni tra L/M e V/S di durata di circa 5.30 ore nella fascia oraria tra le 23.00 e le 5.50 con scorte LV, TE, 2 agenti. Tra il 18 Luglio e il 6 Agosto previste interruzione ambito Rho senza disalimentazioni e scorta mezzi d'opera.</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Nelle fasi con interruzioni notturne, prevista la terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-M/G: circa 30
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: 7 V/S

FMA 




  





*Firest
Dino S.
Loggia*



UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO

PROGRAMMA ATTIVITA'

MAGGIO-AGOSTO 2016

25	TRATTA MI. ROGOREDO – PJ MELEGNANO e stazione di MILANO ROGOREDO: sostituzione g.i.i. e regolazione l.r.s.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione G.I.I. , livellamenti e regolazioni <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (3/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag)</p> <p>La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 20
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 5 V/S

26	VIGEVANO: marciapiedi H55 e realizzazione sottopasso + rifacimento 1° binario.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere propedeutiche la realizzazione sottopasso (da Maggio a Agosto) - realizzazione sottopasso (fase prevista da settembre) - rifacimento marciapiedi H55 (da programmare) - Rinnovamento 1° binario e PRG (fase prevista a Settembre) <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo e per eventuali tolte-tensioni Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 00,00 – 5,00. Per la prima fase, tra Maggio e Agosto, è previsto un impegno medio di personale LV (2/3 Ag), TE (2 Ag), e saltuariamente per eventuale controllo e scorta personale IS. La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza All'occorrenza sarà utilizzato anche personale dei Nuclei Manutentivi limitrofi delle U.M. di giurisdizione.</p> <p>Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: 4
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 1

UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016

27	Passante Ferroviario: sostituzione porte tagliafuoco.
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione porte tagliafuoco. <p>L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale RFI sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo e per eventuali disalimentazioni Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M – V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 00,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (1/2 Ag), TE (2 Ag), IS (1/2 Ag).</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 14
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 3 V/S

28	UMTE2 MILANO LAMBRATE: lavorazioni internalizzate TE
1	<p>Descrizione attività:</p> <p>L'attività consiste in manutenzione TE fatta con personale RFI, sostituzione filo LdC e sostituzione isolatori di sezione in diverse tratte e località del UMTE2 di Milano Lambrate. Periodo Giugno e Luglio Per tali attività sono previste interruzioni notturne tra il L/M e V/S (non più di 3 interruzioni alla settimana) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 – 5,00. È previsto un impegno medio di personale TE (anche fino a 15 Ag a notte per l'utilizzo del cantiere TE durante le notti puntuali di cambio filo) dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM e all'occorrenza con l'ausilio del personale delle altre UMTE del nodo.</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 16
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 8 V/S

RFI RT

[Area containing multiple handwritten signatures and initials in blue and black ink. Some signatures include the words "FIRCAISE" and "Regal" written vertically.]

**UNITA' TERRITORIALE MILANO NODO
PROGRAMMA ATTIVITA'
MAGGIO-AGOSTO 2016**

29	MILANO GRECO PIRELLI: Manutenzione straordinaria armamento
1	<p>Descrizione attività: MANUTENZIONE STRAORDINARIA L'attività consiste in: Rinnovamento, rifacimento, revisioni generali, sostituzione pezzi speciali di scambi, rettifica quote caratteristiche Gli oggetti da mantenere saranno individuati a seguito delle attività cicliche di visite e controllo. L'attività sarà eseguita con ditta appaltatrice e il personale LV sarà impegnato in scorta mezzi d'opera e assistenza e controllo, il personale TE e IS per attività correlate in relazione alle lavorazioni. Per tali attività sono previste interruzioni notturne (L/M - V/S) della durata di 4/5 h all'interno della fascia 23,00 - 5,00. È previsto un impegno medio di personale LV (2/5 Ag), IS (2/3 Ag) e TE (2 Ag) dei nuclei manutentivi e degli altri nuclei del UM, dovranno essere compatibilizzate con le lavorazioni della scheda 8 e 18. La lavorazione sarà eseguita con personale dei nuclei di competenza Previsto ricorso alla terza notte</p>
2	Interruzioni medie L/M-G/V: n° 12 circa
3	Interruzioni puntuali: no
4	Fine settimana: n° 4 V/S

Firma






Firma

